https://github.com/Ophelia0419/Software_Engineering.git

[반려동물 수술 후기 및 병원 정보 공유 플랫폼]

프로젝트 관리 계획서

- 주민서 -

문서번호 : [주민서] 프로젝트관리계획서_260413_Doc-002

소　　속 : 한국항공대학교 소프트웨어학과

팀　　명 : 주민서

팀　　원 : 주민서, 팀원1, 팀원2

교　　수 : 최차봉 교수님

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정사항	비 고
1	2026/04/10	주민서	프로젝트 관리 계획서 작성	
2	2026/04/13	주민서	프로젝트 관리 계획서 작성	

목 차

1. 서론 ---------- 1
1.1 문서의 목적 및 범위 ---------- 1
1.2 프로젝트 개요 ---------- 1
1.3 프로젝트 목표 ---------- 2
1.4 용어 정의 ---------- 2
1.5 참조 문서 ---------- 2

2. 개발 계획 ---------- 3
2.1 개발 절차 모형 ---------- 3
2.2 WBS(Work Breakdown Structure) ---------- 3
2.3 개발 내용 ---------- 4
2.4 개발 일정 ---------- 5

3. 팀 구성 ---------- 6
3.1 팀 구조 ---------- 6
3.2 역할 및 책임 ---------- 6

4. 품질 관리 ---------- 7
4.1 팀 미팅 계획 ---------- 7
4.2 변경 사항 관리 방법 ---------- 7
4.3 산출물 관리 방법 ---------- 8

5. 개발 환경 ---------- 9
5.1 하드웨어 환경 ---------- 9
5.2 소프트웨어 환경 ---------- 9
5.3 기타 개발 환경 ---------- 9

6. 산출물 ---------- 10
6.1 산출물 정의 ---------- 10
6.2 산출물 작성일 및 담당자 ---------- 10
6.3 기타 제약사항 ---------- 11

7. 기타 사항 ---------- 11
7.1 리스크 관리 ---------- 11
8. 참고문헌 및 부록 ---------- 11

1. 서 론

1.1 문서 목적 및 범위

본 프로젝트 계획서는 반려동물 수술 후기 및 병원 정보 공유 플랫폼에 대한 전반적인 내용을 정리하여, 프로젝트를 진행하는 데 있어 각 세부 사항의 지표로 삼는 것을 목적으로 한다.

본 문서는 다음과 같은 범위의 지표로 적용할 수 있다.

① 프로젝트 개요 (프로젝트 정의, 주요 기능 정리)
② 개발 계획 및 환경 (개발 절차 모형, 내용 및 일정, 소프트웨어/하드웨어 환경)
③ 팀 구성 (팀 구조/역할 및 책임)
④ 품질관리 (팀 미팅, 변경 사항 및 산출물 관리)
⑤ 산출물 (산출물 정의, 작성일 및 담당자)

1.2 프로젝트 개요

1.2.1 프로젝트 정의

반려동물 보호자들이 신뢰할 수 있는 병원 정보와 수술 후기를 투명하게 공유하여 의사결정을 돕는 반려동물 의료 정보 공유 플랫폼을 개발한다.

1.2.2 주요 기능 설명

ID	설명
F01	병원별 수술 비용과 진료 서비스에 대한 실제 사용자 후기 조회 및 공유
F02	파충류, 조류, 소형 포유류 등 동물 종류별(특수동물) 진료 가능한 병원 필터링 및 검색
F03	보호자들이 직접 겪은 수술 경험과 치료 과정을 기록하고 소통할 수 있는 수술·치료 후기 게시판 제공
F04	비슷한 수술 사례들의 비용 데이터를 수집하여 사용자가 한눈에 가격을 비교할 수 있도록 지원
F05	(추후 확장) 수의사와 보호자 간의 1:1 Q&A 커뮤니티 및 병원 직접 예약/상담 기능

1.3 프로젝트 목표

정보가 부족한 특수동물(파충류, 조류 등) 보호자들이 맞춤형 병원을 쉽게 찾을 수 있도록 돕고, 실제 경험담과 비용 정보를 투명하게 공유하여 보호자 간의 정보 격차를 해소한다. 이를 통해 반려동물의 건강을 보다 체계적으로 관리할 수 있는 환경을 조성하는 것을 목표로 한다.

1.4 용어 정의

본 문서의 이해를 돕기 위해 사용된 모든 용어 및 약어를 설명하고 정의합니다.

용어	설명
특수동물	개와 고양이를 제외한 파충류, 조류, 소형 포유류 등의 이색 반려동물

1.4 참조 문서

[주민서]시스템정의서_260316_Doc-001.hwp

2. 개발 계획

2.1 개발 절차 모형

1) 프로젝트 특성에 따른 개발 절차 모형: Agile(SCRUM)

본 프로젝트는 반려동물 보호자들의 실제 피드백에 따라 병원 필터링 기준이나 후기 게시판의 UI/UX가 유연하게 변경될 가능성이 높다. 특히 특수동물 데이터의 체계화 과정에서 발생할 수 있는 불확실성을 최소화하고, 단기간 내에 핵심 기능(MVP)을 구현하여 검증하기 위해 Agile 방법론 중 SCRUM 모델을 채택하였다.

- 적용 방식: 2주 단위의 스프린트(Sprint)를 통해 '병원 검색', '후기 작성', '비용 비교' 기능을 단계적으로 완성하며, 매일 데일리 스크럼을 통해 팀 내 개발 진척도를 투명하게 공유하여 기능 요구사항 변화에 기민하게 대응하고자 한다.

2) 분석 및 설계를 위한 방법론: 객체지향 방법론 (Object-Oriented Methodology)

안드로이드 앱 개발 환경의 특성과 시스템의 확장성을 고려하여 객체지향 방법론을 기반으로 분석과 설계를 진행한다.

- 적용 방식: '병원(Hospital)', '수술 후기(Review)', '반려동물 종(PetCategory)' 등 플랫폼의 핵심 엔티티를 독립적인 클래스로 설계한다. 이를 통해 코드의 재사용성을 높이고 캡슐화를 실현하여, 향후 '1:1 Q&A 커뮤니티'나 '예약 시스템'과 같은 고도화 기능 추가 시에도 기존 시스템의 구조적 변경 없이 효율적으로 기능을 확장하고 유지보수할 수 있도록 한다.

2.2 WBS(Work Breakdown Structure)

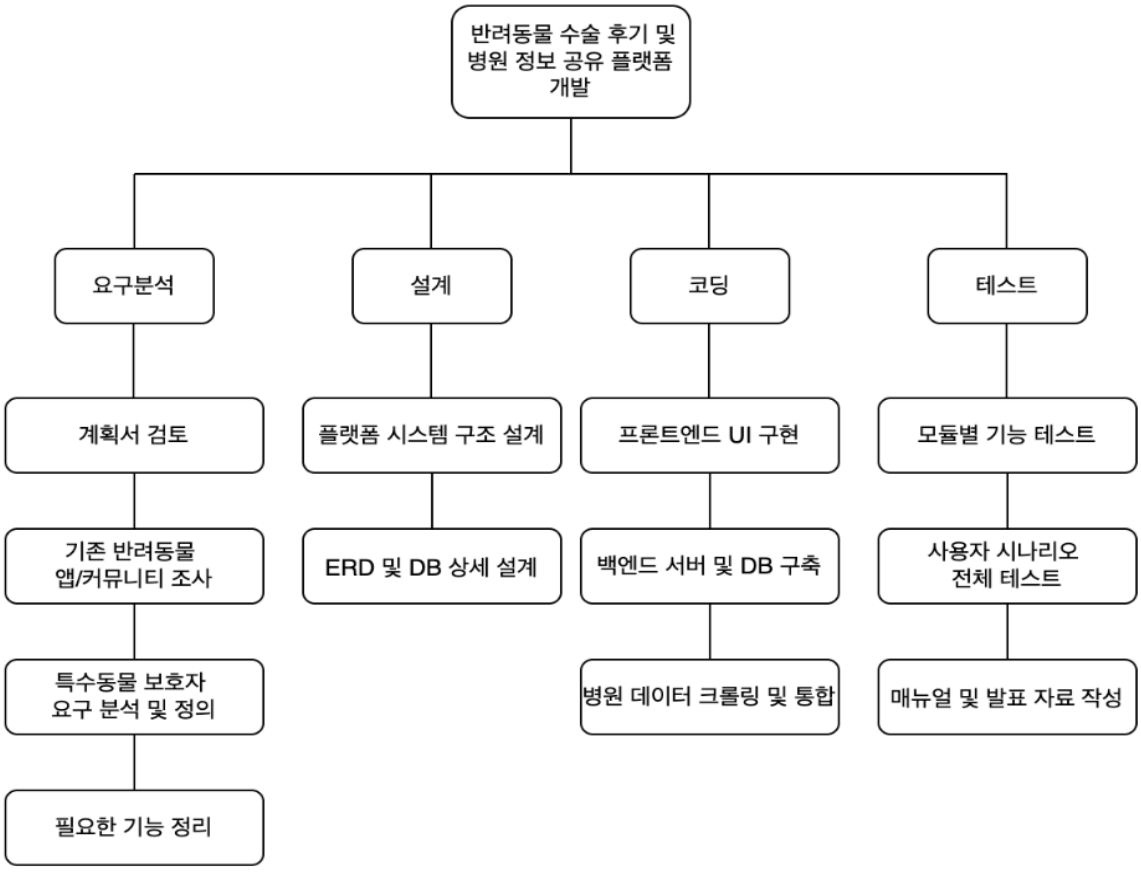

2.3 개발 활동

개발 활동	설명
프로젝트 계획	프로젝트 계획서 작성
요구사항 정의	요구사항 정의서 작성
요구사항 분석	요구사항 분석서 작성
Product Backlog	수술 후기, 필터링, 비용 비교 등 요구사항을 우선순위대로 순서화
Sprint Planning Meeting	스프린트 시작 전 백로그 계획
Daily Scrum Meeting	매일 진행상황과 이슈(DB 연동 등) 공유
Sprint	짧은 단위로 후기 게시판, 검색 필터 등의 기능을 구현하며 피드백 반영
Sprint Retrospective	스프린트 기간 동안 팀 내부에서 발생한 일들을 회고하며 개선할 것, 잘한 것, 새로 시작할 것을 도출
Sprint Review	스프린트 종료 시점에 팀원 전체가 각자 한 일 리뷰 및 문서화

2.4 개발 일정

활동	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
프로젝트 요약												
프로젝트 계획												
요구사항 정의 및 분석												
Product Backlog												
Sprint Planning Meeting												
Sprint 1												
Sprint 2												
Sprint 3												
Sprint 4												
Sprint 5												
Sprint 6												
Sprint 7												
Sprint 8												
Sprint 9												
Sprint 10												
Daily Scrum Meeting												
Sprint Retrospective												
Sprint Review												
프로젝트 종료												

3. 팀 구성

3.1 팀 구조

팀장의 역할은 있지만, 모든 멤버가 상호 협력하고 코드를 리뷰(Code Review)하며 진행하는 수평적 팀 구조를 채택한다.

3.2 역할 및 책임

이름	역할	책임 (공동 / 개별)	
주민서	팀장	문서관리 자료조사	프로젝트 총괄, 일정 및 산출물 관리, 데이터베이스(ERD) 아키텍처 설계
팀원1	팀원		API 서버 구축, 데이터 필터링 로직, 병원 데이터베이스 관리
팀원2	팀원		사용자 화면(UI) 구현, 후기 게시판 및 검색 필터 화면 연동

4. 품질 관리

4.1 팀 미팅 계획

(1) Sprint Planning Meeting
- 팀 미팅 시간 : 매주 수요일 18시
- 토의 내용 : Sprint 목표와 Sprint Backlog를 계획
- 미팅 참석자 : 팀원, 팀장

(2) Daily Scrum Meeting
- 팀 미팅 시간 : 매일 18시에 30분간 진행
- 토의 내용 : 어제 한 일, 오늘 할 일, 장애 현상 등을 공유
- 미팅 참석자 : 팀원, 팀장

(3) Sprint Review
- 팀 미팅 시간 : Sprint 종료 시점
- 토의 내용 : Sprint 기간 동안 팀원 전체가 각자 한 일 리뷰
- 미팅 참석자 : 팀원, 팀장

(4) Sprint Retrospective
- 팀 미팅 시간 : Sprint 종료 시점
- 토의 내용 : Sprint 기간 동안 팀 내부에서 발생한 일들을 회고하며 개선할 것, 잘한 것, 새로 시작할 것을 도출

(5) 비정기 회의
- 프로젝트 진행에 문제가 발생하여 회의가 필요한 경우에 비대면 또는 대면으로 진행된다.
- 비정기 회의는 팀장 또는 지도교수 또는 멘토에 의해 요청될 수 있다.
- 미팅 참석자 : 팀원, 팀장, (지도교수, 멘토)

4.2 변경사항 관리 방법

- 핵심 기능(비용 비교 로직 변경, 특수동물 카테고리 추가 등) 변경 시 팀원 전체의 합의가 필요하다.
- 의견 충돌 시 PM이 발언권을 가지며, 변경 전후 사항은 반드시 문서화한다.
- 변경사항은 교수님께 바로 보고하며 이후 변경될 수 있다.

4.3 산출물 관리 방법

4.3.1 산출물에 대한 명명(Naming) 방법

- 앱 소프트웨어: 버전_해당 버전의 산출 일자, 확장자 형식으로 관리한다.
  (예: v1.0.2_2026_05_20.apk, v1.0.0_2026_06_01.aab)
- 문서: [팀명]문서명_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전 형식을 따른다.
  (예:[주민서]요구사항분석서_260515_Doc-001.pdf,[주민서]소프트웨어설계서_260522_Doc-002.pdf)
- 기타 파일: 디자인 에셋(아이콘, 로고 등)이나 미디어 파일은 파일의 목적이 명확하게 드러나도록 명칭을 부여한다.
  (예: 260510_hospital_icon.png, 260512_intro_video.mp4)

4.3.2 산출물의 버전 관리 방법 및 담당자

- **앱 및 소스 코드:** GitHub 리포지토리를 기반으로 관리하며, 빌드된 파일명 맨 앞에는 반드시 버전을 기재한다. (담당자: 팀원 전체)
- **문서:** 파일명 맨 뒤에 수정 날짜를 기재하고, 문서 본문 내 '제/개정 이력' 테이블을 반드시 최신화한다. (담당자: 주민서)
- **기타 리소스:** 파일명 앞에 생성 날짜를 붙이며, 동일한 날짜에 여러 번 수정될 경우 파일명 뒤에 숫자(1, 2 등)를 추가하여 구분한다. (담당자: 팀원 전체)

4.3.3 산출물의 저장 방법

- 소스 코드: GitHub를 사용하여 코드의 이력을 추적하고 협업을 진행한다.
- 문서: 팀원 공유 클라우드 서버(Google Drive 또는 네이버 MYBOX) 및 팀원별 하드웨어에 이중 백업하여 보관한다.
- 기타 리소스: 이미지 및 영상 파일 등은 용량을 고려하여 팀 공유 클라우드 내 별도 폴더를 생성하여 관리한다.

5. 개발 환경

5.1 하드웨어 개발 환경

구분	spec
노트북	MacBook Air (M2, 2022) • Chip: Apple M2 • Memory: 16 GB
안드로이드 스마트폰	실제 기기 기반 앱 구동 및 UI/UX 테스트용

5.2 소프트웨어 개발 환경

구분	type	spec
macOS	OS	macOS Tahoe (버전 26.3)
IDE	개발 툴	Android Studio (Kotlin 기반 안드로이드 플랫폼 앱 개발)

5.3 기타 개발 환경

해당없음

6. 산출물

6.1 산출물 정의

형식 : [팀명]문서명_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전

6.2 산출물 작성일 및 담당자

산출물	최종 작성일	최종 검토자	작성 책임자
[주민서]시스템정의서	2026-03-16	주민서	주민서
[주민서]프로젝트관리계획서	2026-04-13	주민서	주민서
[주민서]요구사항정의서	2026-05-21		
[주민서]요구사항분석서	2026-05-21		
[주민서]소프트웨어설계서	2026-05-25		

6.3 기타 제약사항

해당사항 없음

7. 기타 사항

7.1 리스크 관리

No	Risk	Critical	Occur	Mitigation Plan	Respon
1	병원/수술비 데이터 확보 부족	High	medium	초기에는 공공 데이터나 웹 크롤링을 통해 기본 병원 정보를 구축하고, 후기 작성자에게 리워드를 제공하는 이벤트 기획 고려	주민서

8. 참고문헌 및 부록

-부록 1 : 시스템정의서 ([주민서]시스템정의서_260316_Doc-001)
